

Ofício nº 059/2025

Turiaçu – MA, 06 de Outubro de 2025

À
Câmara Municipal de Buriti – Ma

Assunto: Solicitação de Pagamento
Ref. Contrato Administrativo nº 020/2025

Sr'(a). Controlado(a)r da Câmara,

A empresa **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 32.241.345/0001-23, com sede na Avenida Santos Dumont, Nº 2027, Bairro Canário, Turiaçu/MA - CEP: 65.278-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Robson Raikard de Jesus Fernandes**, portador da carteira de identidade nº 039911032010-0 SESP-MA e do CPF nº 606.214.033-26.

Vem através deste, **solicitar o pagamento da nota fiscal em anexo referente a 1º medição dos serviços executados reforma e ampliação da sede da Câmara Municipal de Buriti/MA. conforme contrato nº 020/2025.**

Dados Bancários:

Banco do Brasil: Agência 1807-4; Conta Corrente: 39260-X

Contac Comercio e Servicos Ltda.

Valor solicitado de R\$ 80.382,37 (oitenta mil e trezentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.10.06 15:49:31 -03'00'

CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Robson Raikard de Jesus Fernandes

CPF nº 606.214.033-26

Proprietário

 PREFEITURA DE TURIAÇU SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	NOTA FISCAL	0000300	
	NÚMERO RPS		
	DATA DE EMISSÃO NOTA	06/10/2025 14:27:34	
	DATA DO FATO GERADOR	06/10/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR		NOME FANTASIA PRESTADOR			
CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA		CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA			
ENDEREÇO					COMPLEMENTO
AV SANTOS DUMONT, Nº 2027, CANÁRIO, TURIAÇU MA . 65278000					
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
32.241.345/0001-23	SIM	00306	125848692		

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				
CAMARA MUNICIPAL DE BURITI				
ENDEREÇO				COMPLEMENTO
AV CANDOCA MACHADO, Nº 125, CENTRO , CEP 65515000, BURITI - MA				
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
07.509.201/0001-68				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL					
UN	1	REFERENTE A 1º PRIMEIRA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI/MA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025 CAMARA MUNICIPAL DE BURITI/MA FISCAL DE CONTRATOS Testamos para os devidos fins que o recebimento está em ordem e de acordo com o pedido ☐ Os materiais foram recebidos ☒ Os serviços foram prestados Em: <u>06/10/25</u> Maria Luíza Morais Chaves Portaria 17/2025 CPF: 089.437.573-36	80.382,37	80.382,37					
OBSERVAÇÕES				TOTAL GERAL					
				80.382,37					
		IMPOSTOS FEDERAIS		IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR LÍQUIDO			
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL		ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,0000 %	32.152,95	1.607,65
									78.774,72
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO									
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS									

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.229,42	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado Fora do Município	ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	BURITI - MA	R\$ 10.811,43 (13.45%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 0c49e029623c9150517e538210107bff

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - d9e9602590234a34ad32bf898d656f79

Recebi(emos) de CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000300. _____/_____/_____ Data do Recebimento _____ Identificação e assinatura do receptor		NÚMERO NOTA FISCAL 0000300
--	--	---



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

LAUDO FOTOGRÁFICO




1. INTRODUÇÃO

Este laudo fotográfico tem como objetivo registrar, por meio de imagens e descrições técnicas, as condições observadas no local mencionado, de forma a documentar o estado atual da edificação/local/objeto vistoriado.

2. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI

Local: CENTRO

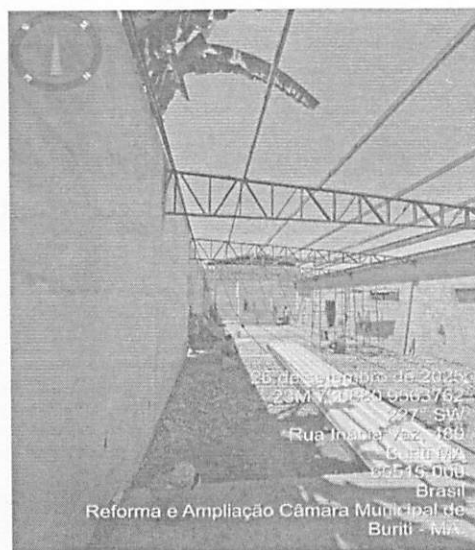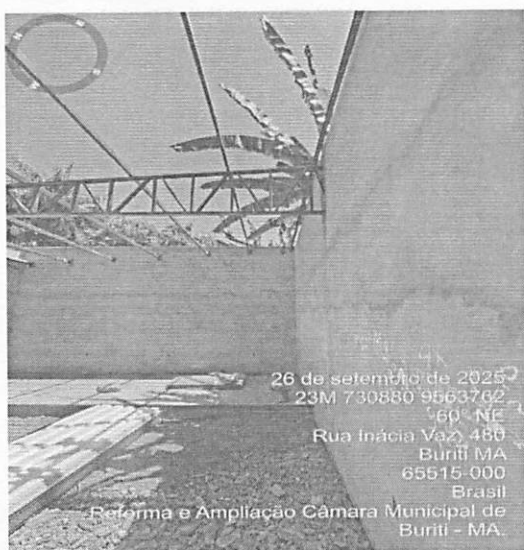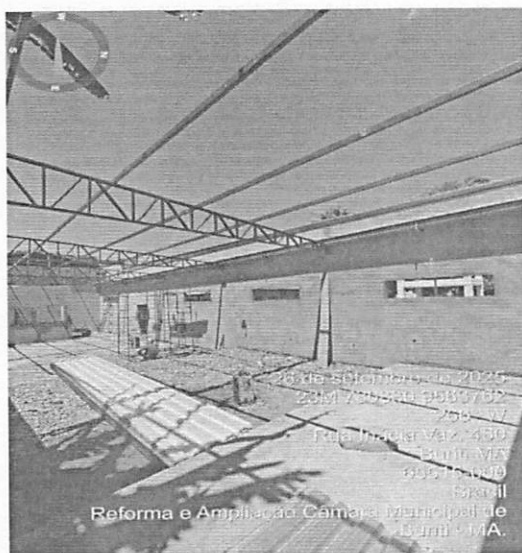



Câmara Municipal de Buriti

Avenida Candoca Machado, nº 125/ Centro/ Buriti -MA / CEP: 65515-000



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

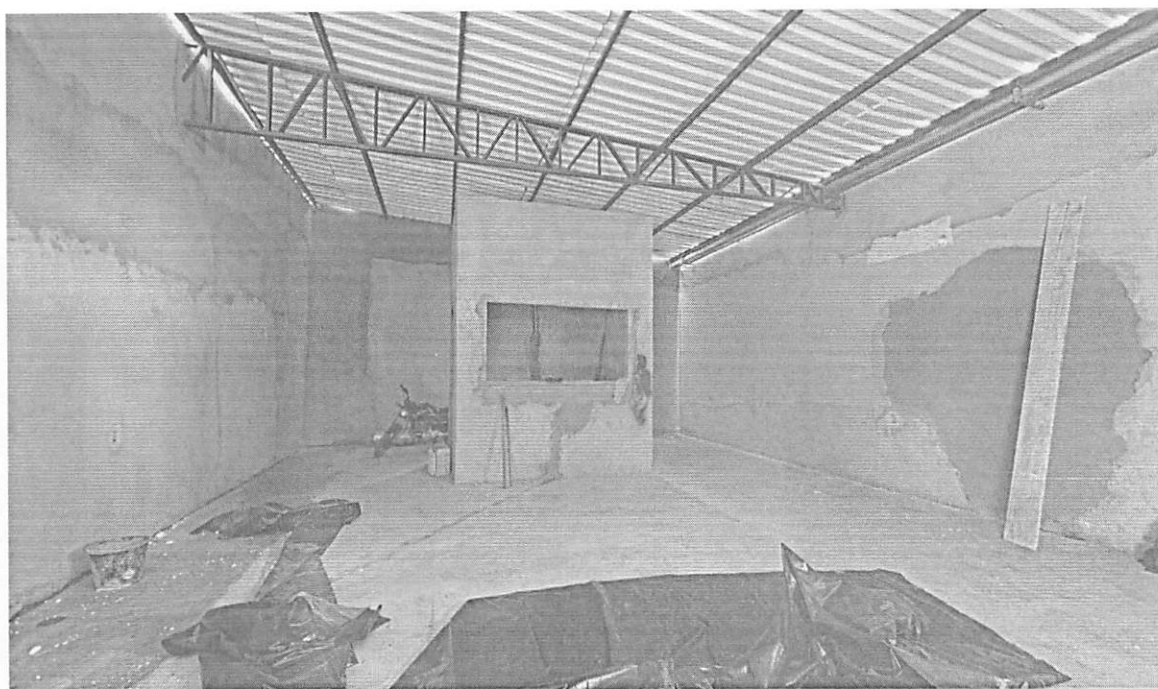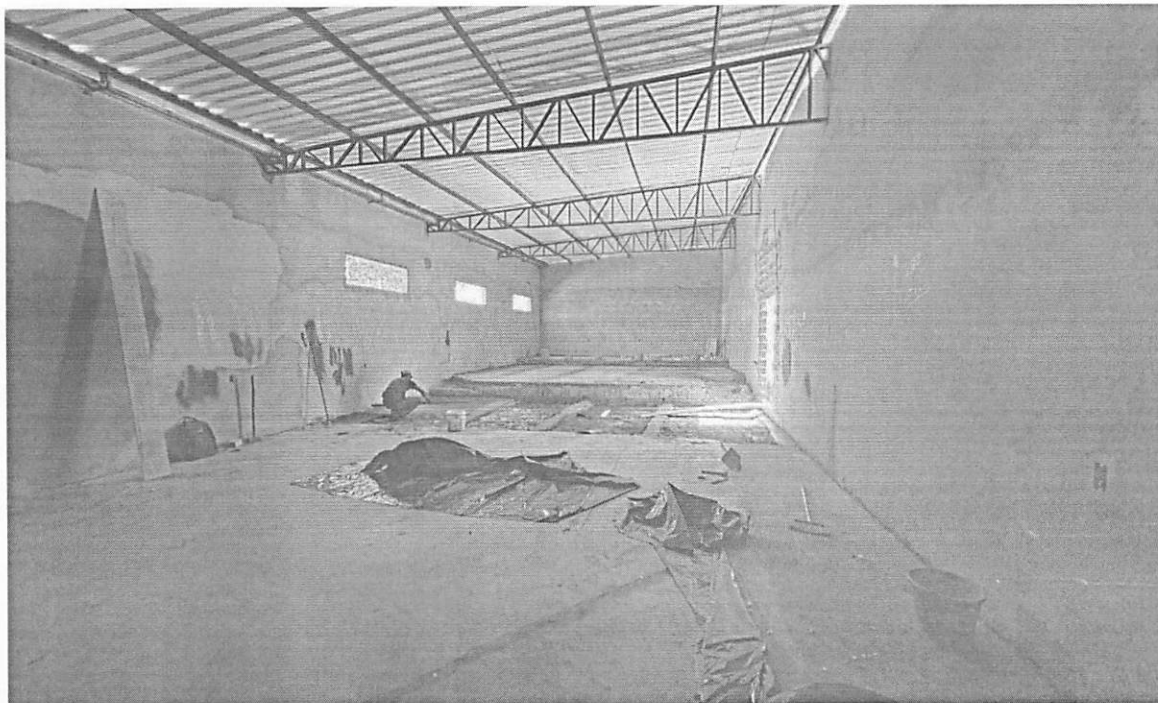

Câmara Municipal de Buriti

Avenida Candoca Machado, nº 125/ Centro/ Buriti -MA / CEP: 65515-000



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250974728

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20250956628

1. Responsável Técnico

JOAO VICTOR PERES LIMA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1115837842

Registro: 1115837842MA

Empresa contratada: **CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Registro : 0005423260-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

AVENIDA CANDOCA MACHADO

Complemento:

Cidade: **BURITI**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 07.509.201/0001-68

Nº: 125

CEP: 65515000

Contrato: 020/2025

Celebrado em: 13/08/2025

Valor: **R\$ 1.242.433,42**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CANDOCA MACHADO

Complemento:

Cidade: **BURITI**

Data de Início: 13/08/2025

Previsão de término: 11/12/2025

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: 125

CEP: 65515000

Coordenadas Geográficas: -3.940326, -42.930528

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA**

CPF/CNPJ: 07.509.201/0001-68

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	954,96	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA	909,50	m²
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	59,76	m³
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	488,02	m²
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	7,00	pontos
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	7,00	pontos
49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS	38,28	m³
49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	50,00	pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A4292
 Impresso em: 16/10/2026 às 13:28:17 por: , ip: 170.81.193.130

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8303





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250974728

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20250956628

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

JOAO VICTOR PERES LIMA

RNP: 1115837842

Data: 16/10/2026 13:28:17

JOAO VICTOR PERES LIMA - CPF: *.488.903-****

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA - CNPJ: 07.509.201/0001-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 14/10/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A4292
Impresso em: 16/10/2026 às 13:28:17 por: , ip: 170.81.193.130

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão



 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23				MUNICÍPIO:		BURITI - MA						Nº da Medição		1		Planilha de Medição					
PLANILHA DE MEDIÇÃO				EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23											
PROPOSTANTE						DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		03/10/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA						FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)					
Nº DO CONTRATO						020/2025		PRÓPRIOS		R\$ 1.242.433,43				R\$ 80.382,37							
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
				UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
DESCRIÇÃO																					
Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.																					
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1		Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021		un	1,00	R\$ 750,70	R\$ 750,70	1,00	100,00%	R\$ 750,70		0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 750,70					
1.2		LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 03/2024		m²	957,85	R\$ 4,56	R\$ 4.367,79		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
1.3		LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO		m²	525,15	R\$ 7,12	R\$ 3.739,06		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
2 DEMOLICOES, REMOÇÕES E RETIRADAS																					
2.1		REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023		m²	261,07	R\$ 7,58	R\$ 1.978,91	184,00	70,48%	R\$ 1.394,72		0,00%	R\$ -	184,00	70,48%	R\$ 1.394,72					
2.2		Remoção de telhamento com telhas cerâmicas		m²	261,07	R\$ 11,80	R\$ 3.080,62	184,00	70,48%	R\$ 2.171,20		0,00%	R\$ -	184,00	70,48%	R\$ 2.171,20					
2.3		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023		m²	20,16	R\$ 9,44	R\$ 190,31	3,78	18,75%	R\$ 35,68		0,00%	R\$ -	3,78	18,75%	R\$ 35,68					
2.4		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023		UN	8,00	R\$ 12,48	R\$ 99,84		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
2.5		DEMOLICAO DE PISO INDUSTRIAL		m²	261,07	R\$ 55,62	R\$ 14.520,71	78,32	30,00%	R\$ 4.356,21		0,00%	R\$ -	78,32	30,00%	R\$ 4.356,21					
2.6		DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023		m³	130,37	R\$ 55,42	R\$ 7.225,10	52,15	40,00%	R\$ 2.890,04		0,00%	R\$ -	52,15	40,00%	R\$ 2.890,04					
2.7		DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023		m³	1,50	R\$ 541,74	R\$ 812,61		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO																					
3.1		SAPATAS					R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
3.1.1		ESCAVACAO MANUAL SOLO 1a. CATEGORIA ATÉ 1,50m		m³	52,80	R\$ 59,21	R\$ 3.126,28	2,59	4,91%	R\$ 153,47		0,00%	R\$ -	2,59	4,91%	R\$ 153,47					
3.1.2		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023		m³	38,28	R\$ 25,47	R\$ 974,99	1,56	4,06%	R\$ 39,61		0,00%	R\$ -	1,56	4,06%	R\$ 39,61					
3.1.3		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024		KG	551,84	R\$ 15,88	R\$ 8.763,21	110,37	20,00%	R\$ 1.752,64		0,00%	R\$ -	110,37	20,00%	R\$ 1.752,64					
3.1.4		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024		KG	82,47	R\$ 22,15	R\$ 1.826,71	16,49	20,00%	R\$ 365,34		0,00%	R\$ -	16,49	20,00%	R\$ 365,34					
3.1.5		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024		m²	125,40	R\$ 253,85	R\$ 31.832,79	25,08	20,00%	R\$ 6.366,55		0,00%	R\$ -	25,08	20,00%	R\$ 6.366,55					
3.1.6		CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024		m³	14,52	R\$ 924,77	R\$ 13.427,66	2,90	20,00%	R\$ 2.685,53		0,00%	R\$ -	2,90	20,00%	R\$ 2.685,53					
3.2 VIGA BALDRAME																					
3.2.1		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024		m²	225,69	R\$ 98,68	R\$ 22.271,08	45,14	20,00%	R\$ 4.454,21		0,00%	R\$ -	45,14	20,00%	R\$ 4.454,21					
3.2.2		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024		KG	451,12	R\$ 17,96	R\$ 8.102,11	90,22	20,00%	R\$ 1.620,42		0,00%	R\$ -	90,22	20,00%	R\$ 1.620,42					
3.2.3		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024		KG	203,07	R\$ 22,15	R\$ 4.498,00	40,61	20,00%	R\$ 899,60		0,00%	R\$ -	40,61	20,00%	R\$ 899,60					
3.2.4		CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024		m³	16,92	R\$ 776,59	R\$ 13.139,90	3,38	20,00%	R\$ 2.627,98		0,00%	R\$ -	3,38	20,00%	R\$ 2.627,98					
3.2.5		Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltico Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizadora		m²	225,69	R\$ 27,65	R\$ 6.240,32	45,14	20,00%	R\$ 1.248,06		0,00%	R\$ -	45,14	20,00%	R\$ 1.248,06					
3.3 PILARES																					

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.10.07 11:38:05
-03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2025.10.07 11:35:18
-03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA								Nº da Medição		1		Planilha de Medição							
		OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.																			
PLANILHA DE MEDIÇÃO				EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23													
PROPONENTE				CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA		DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições				12		Período da Medição		03/10/2025	
Nº DO CONTRATO						FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO				Medição Atual (R\$)									
020/2025								PRÓPRIOS				R\$ 1.242.433,43				R\$ 80.382,37							
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL									
								UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL			
3.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020		m²	209,09	R\$ 109,91	R\$ 22.981,08	20,91	10,00%	R\$ 2.298,10		0,00%	R\$ -	20,91	10,00%	R\$ 2.298,10								
3.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022		KG	471,04	R\$ 13,05	R\$ 6.147,07	47,10	10,00%	R\$ 614,70		0,00%	R\$ -	47,10	10,00%	R\$ 614,70								
3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022		KG	186,28	R\$ 15,70	R\$ 2.924,59	18,63	10,00%	R\$ 292,45		0,00%	R\$ -	18,63	10,00%	R\$ 292,45								
3.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022		m³	11,40	R\$ 1.026,44	R\$ 11.701,41	1,14	10,00%	R\$ 1.170,14		0,00%	R\$ -	1,14	10,00%	R\$ 1.170,14								
3.4	VIGA SUPERIOR				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
3.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020		m²	225,69	R\$ 110,42	R\$ 24.920,68	22,57	10,00%	R\$ 2.492,06		0,00%	R\$ -	22,57	10,00%	R\$ 2.492,06								
3.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022		KG	669,24	R\$ 13,05	R\$ 8.733,58	66,92	10,00%	R\$ 873,35		0,00%	R\$ -	66,92	10,00%	R\$ 873,35								
3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022		KG	203,07	R\$ 15,70	R\$ 3.188,19	20,31	10,00%	R\$ 318,81		0,00%	R\$ -	20,31	10,00%	R\$ 318,81								
3.4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022		m³	16,92	R\$ 1.044,09	R\$ 17.666,00	1,69	10,00%	R\$ 1.766,60		0,00%	R\$ -	1,69	10,00%	R\$ 1.766,60								
3.5	LAJE				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
3.5.1	LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 4,0m		m²	3,81	R\$ 101,10	R\$ 385,19		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014		m²	909,50	R\$ 88,99	R\$ 80.936,40	240,00	26,39%	R\$ 21.357,60		0,00%	R\$ -	240,00	26,39%	R\$ 21.357,60								
4.2	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021		m²	18,60	R\$ 938,45	R\$ 17.455,17		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								
5	COBERTURA				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
5.1	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA SANDUICHE)				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
5.1.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trellia Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada		m²	488,02	R\$ 189,20	R\$ 92.333,38		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								
5.1.2	TELHA METÁLICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR30		m²	488,02	R\$ 217,12	R\$ 105.958,90		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								
5.2	CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
5.2.1	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,10m		M	102,70	R\$ 71,90	R\$ 7.384,13		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								
5.2.2	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm		m	48,25	R\$ 237,07	R\$ 11.438,62		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								
5.2.3	RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA		M	48,25	R\$ 56,44	R\$ 2.723,23		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								
6	FORRO				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
6.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM		m²	487,46	R\$ 72,01	R\$ 35.101,99		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
7.1	ESGOTO				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -									
7.1.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	7,00	R\$ 238,25	R\$ 1.667,75		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -								

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por CONTAC
COMERCIO E SERVICOS LTDA:32241345000123
Dados: 2025.10.07 11:38:23 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por JOAO
VICTOR PERES LIMA:05048890361
Dados: 2025.10.07 11:35:35 -03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		1		Planilha de Medição				
		OBJETO:		Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia para a reforma e ampliação da sede da câmara municipal de Buriti-MA.															
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23											
PROPOSTANTE				DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		03/10/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA				FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)					
Nº DO CONTRATO				PROPRIOS		R\$		1.242.433,43				R\$		80.382,37					
020/2025				EXECUTADO															
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
		UNID.	QUANT.	PRECQ Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
7.1.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 4.500,53	R\$ 4.500,53		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.3	Caixa de gordura "ca" 60 x 60 x 65cm	un	1,00	R\$ 690,32	R\$ 690,32		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.4	CAIXA DE PASSAGEM 1,0x1,0x1,0m CONCRETO FCK 150Kgf/cm2	UN	4,00	R\$ 2.937,18	R\$ 11.748,72		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	150,00	R\$ 34,79	R\$ 5.218,50		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	120,00	R\$ 11,96	R\$ 1.435,20		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	60,00	R\$ 19,85	R\$ 1.191,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	12,00	R\$ 25,12	R\$ 301,44		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,00	R\$ 11,11	R\$ 199,98		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.10	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	UN	6,00	R\$ 68,67	R\$ 412,02		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.11	Tê 90º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6,00	R\$ 10,19	R\$ 61,14		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$ 49,92	R\$ 199,68		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
7.1.13	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	1,00	R\$ 74,19	R\$ 74,19		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
8.1	ÁGUA FRIA			R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
8.1.1	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9,00	R\$ 256,70	R\$ 2.310,30		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 72,89	R\$ 291,56		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	80,00	R\$ 13,62	R\$ 1.089,60		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	120,00	R\$ 33,41	R\$ 4.009,20		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	R\$ 6,84	R\$ 82,08		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	15,00	R\$ 6,90	R\$ 103,50		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	R\$ 9,53	R\$ 190,60		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	R\$ 12,45	R\$ 249,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
8.1.9	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	2,00	R\$ 73,23	R\$ 146,46		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.10.07 11:38:43
-03'00'

JOAO VICTOR
PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por JOAO
VICTOR PERES LIMA:05048890361
Dados: 2025.10.07 11:35:54 -03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		1		Planilha de Medição				
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP					CNPJ: 32.241.345/0001-23										
PROPOONENTE				DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		03/10/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA				FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)					
Nº DO CONTRATO				PROPRIOS		R\$		1.242.433,43				R\$		80.382,37					
020/2025				EXECUTADO															
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
8.1.10	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 3.000 litros apoiado em estrutura pré-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindro o c/altura útil = 6,00m, incluso frete e monta em no local exceto inst.hidráulica	UN	1,00	R\$ 12.199,04	R\$ 12.199,04		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9	INTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
9.1	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO			R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
9.1.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	50,00	R\$ 198,61	R\$ 9.930,50		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.1.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	62,00	R\$ 190,70	R\$ 11.823,40		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.1.3	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W BRONZEART	UN	62,00	R\$ 56,52	R\$ 3.504,24		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.1.4	ARANDELA PARA PAREDE TLF 21 BR FOSCO TASCHIBRA	UN	8,00	R\$ 90,70	R\$ 725,60		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.1.5	LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10	UN	4,00	R\$ 95,81	R\$ 383,24		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.2	QUADROS E DISJUNTORES			R\$ 1.559,19	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -		#DIV/0!	R\$ -	-	#DIV/0!	R\$ -					
9.2.1	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	1,00	R\$ 75,64	R\$ 75,64		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 146,72	R\$ 146,72		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 576,21	R\$ 576,21		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.2.4	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 182,70	R\$ 182,70		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	24,00	R\$ 24,08	R\$ 577,92		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.3	CABOS ELÉTRICOS			R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	800,00	R\$ 4,48	R\$ 3.584,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	800,00	R\$ 3,06	R\$ 2.448,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1500,00	R\$ 6,96	R\$ 10.440,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.3.4	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	M	250,00	R\$ 20,43	R\$ 5.107,50		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.4	SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO			R\$ -	R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
9.4.1	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	500,00	R\$ 6,56	R\$ 3.280,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.4.2	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	500,00	R\$ 4,90	R\$ 2.450,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.4.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	24,00	R\$ 200,76	R\$ 4.818,24		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
9.4.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	24,00	R\$ 45,54	R\$ 1.092,96		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.10.07 11:39:07 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2025.10.07 11:36:13 -03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICIPIO:		BURITI - MA						Nº da Medição		1		Planilha de Medição					
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23											
PROPONENTE				DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		03/10/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA				FONTE DE RECURSOS				VALOR CONTRATO						Medição Atual (R\$)					
Nº DO CONTRATO				PROPRIOS		R\$		1.242.433,43				R\$		80.382,37					
020/2025				EXECUTADO															
ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL							
		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL					
9.4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	24,00	R\$ 12,74	R\$ 305,76		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
10	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
10.1	CAIXA DE PASSAGEM E INSPECAO EM CONCRETO 40x40x40cm C/ TAMPA	UN	2,00	R\$ 195,91	R\$ 391,82		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	80,00	R\$ 15,85	R\$ 1.268,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
11.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	15,00	R\$ 198,61	R\$ 2.979,15		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.2	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	15,00	R\$ 18,51	R\$ 277,65		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.3	Placa de sinalizacao de segurancia contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	15,00	R\$ 15,01	R\$ 225,15		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.4	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	3,00	R\$ 253,16	R\$ 759,48		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.5	SUPORE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO	UN	3,00	R\$ 34,54	R\$ 103,62		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
11.6	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	3,00	R\$ 7,00	R\$ 21,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
12	REVESTIMENTO				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	1819,00	R\$ 8,41	R\$ 15.297,79	100,00	5,50%	R\$ 841,00		0,00%	R\$ -	100,00	5,50%	R\$ 841,00					
12.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	1819,00	R\$ 24,58	R\$ 44.711,02	100,00	5,50%	R\$ 2.458,00		0,00%	R\$ -	100,00	5,50%	R\$ 2.458,00					
12.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	1819,00	R\$ 39,74	R\$ 72.287,06	100,00	5,50%	R\$ 3.974,00		0,00%	R\$ -	100,00	5,50%	R\$ 3.974,00					
12.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	m²	101,00	R\$ 79,03	R\$ 7.982,03		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
13	PISO				R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ -					
13.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF 07/2021	m²	487,48	R\$ 46,10	R\$ 22.472,82	176,00	36,10%	R\$ 8.113,60		0,00%	R\$ -	176,00	36,10%	R\$ 8.113,60					
13.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²	70,76	R\$ 80,55	R\$ 5.699,71		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
13.3	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	50,00	R\$ 95,32	R\$ 4.766,00		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 02/2023 PE	m²	487,48	R\$ 142,33	R\$ 69.383,02		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					
13.5	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO 16 FACES 10cm 50Mpa	m²	380,00	R\$ 105,01	R\$ 39.903,80		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -					

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.10.07 11:39:31 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2025.10.07 11:36:35 -03'00'

 CONTAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 32.241.345/0001-23		MUNICÍPIO:		BURITI - MA							Nº da Medição		1		Planilha de Medição				
PLANILHA DE MEDIÇÃO		EMPRESA EXECUTORA:		CONTAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP				CNPJ: 32.241.345/0001-23											
PROPOSTENTE				DATA INÍCIO DA OBRA:		13/08/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO		12 meses		Número medições		12		Período da Medição		03/10/2025	
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA																			
Nº DO CONTRATO				FONTE DE RECURSOS		VALOR CONTRATO								Medição Atual (R\$)					
020/2025				PROPRIOS		R\$		1.242.433,43						R\$		80.382,37			
ITENS		SERVIÇOS LICITADOS		CONTRATADO				NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL					
								QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL			
14		ESQUADRIAS		UNID.	QUANT.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL	QUANT.	%	PREÇO TOTAL			
14.1		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	8,00	R\$ 1.222,64	R\$ 9.781,12		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.2		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	18,00	R\$ 1.115,26	R\$ 20.074,68		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.3		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	1,00	R\$ 1.051,25	R\$ 1.051,25		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.4		PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		m²	8,40	R\$ 860,37	R\$ 7.227,10		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.5		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024		m²	4,00	R\$ 405,12	R\$ 1.620,48		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.6		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024		m²	4,90	R\$ 685,98	R\$ 3.361,30		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.7		Grade em metalon		m²	82,50	R\$ 311,08	R\$ 25.664,10		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.8		PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	2,00	R\$ 337,31	R\$ 674,62		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.9		PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1-6 COM ADITIVO. AF_11/2020		M	25,00	R\$ 193,39	R\$ 4.834,75		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.10		PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO		m²	11,70	R\$ 448,29	R\$ 5.244,99		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.11		JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 4MM		m²	10,50	R\$ 820,57	R\$ 8.615,98		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
14.12		VIDRO LAMINADO INCOLOR 8mm CORTE RETO P/JANELA FIXA		m²	3,85	R\$ 844,02	R\$ 3.249,47		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
15		LOUCAS E METAIS					R\$ -			R\$ -			R\$ -				R\$ -		
15.1		VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	5,00	R\$ 567,71	R\$ 2.838,55		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
15.2		BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)		UN	2,00	R\$ 1.209,56	R\$ 2.419,12		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
15.3		CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	9,00	R\$ 553,59	R\$ 4.982,31		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
15.4		Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular		un	7,00	R\$ 23,72	R\$ 166,04		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
15.5		BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)		m²	5,55	R\$ 499,32	R\$ 2.771,22		0,00%	R\$ -		0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	R\$ -		
16		PINTURA					R\$ -			R\$ -			R\$ -				R\$ -		
16.1		PINTURA INTERNA					R\$ -			R\$ -			R\$ -				R\$ -		

CONTAC COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:32241345000123

Assinado de forma digital por
CONTAC COMERCIO E SERVICOS
LTDA:32241345000123
Dados: 2025.10.07 11:39:55 -03'00'

JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361

Assinado de forma digital por
JOAO VICTOR PERES
LIMA:05048890361
Dados: 2025.10.07 11:36:54 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 211760/25

Data da

14/08/2025 09:21:04

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/08/2025 09:21:04



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074607/25

Data da

12/08/2025 11:11:01

Inscrição Estadual: 125848692

CPF/CNPJ: 32241345000123

Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE SANTOS DUMONT, 2027 CEP: 65278000 - CANARIO

Telefone: (98)85380314

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/11/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/08/2025 11:11:01



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.241.345/0001-23
Certidão n°: 26373264/2025
Expedição: 13/05/2025, às 14:15:01
Validade: 09/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.241.345/0001-23**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.241.345/0001-23
Razão Social: CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: - AV SANTOS DUMONT 2027 - / - / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100520095248843028

Informação obtida em 06/10/2025 15:51:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS****Nº. 0001943****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO C.M.C. 306	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL) CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 32.241.345/0001-23
-----------------------------	---	---------------------------------------

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 2027	Nº DO CEP 65278000	BAIRRO CANÁRIO
MUNICÍPIO TURIAÇU	UF MA	EDIFÍCIO	APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nº. DOCUMENTO 32.241.345/0001-23
FINALIDADE DA CERTIDÃO	

OBSERVAÇÕES**Data de Emissão: 16/09/2025****Data de Validade: 15/12/2025**

A prefeitura do Município de Turiaçu - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação REGULAR perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em DÍVIDA ATÍVA até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:
A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

TURIAÇU (MA), 16 de SETEMBRO de 2025

Extrato de pagamentos / transferências

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:58:35
167701677 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNIC BURITI MA
AGENCIA: 1677-2 CONTA: 33.512-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.807.000.039.260
VALOR TOTAL	77.970,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTAC COMERC SERV EIRELI
AGENCIA: 1807-4 CONTA: 39.260-X
NR. DOCUMENTO 551.677.000.033.512

=====

NR.AUTENTICACAO	4.3B6.8B5.971.B94.421
-----------------	-----------------------
